



Proyecto Manejo Sostenible de los Recursos Marinos Vivos Compartidos del Gran Ecosistema Marino del Caribe (CLME) y Regiones Adyacentes

**Proyecto Piloto:
Manejo Subregional de las Pesquerías de Langosta
Espinosa del Caribe *Panulirus argus*
(MASPLESCA)**

**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
PROYECTOS PILOTOS Y ESTUDIOS DE CASO DEL CLME**

Diciembre 2012

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

SECCIÓN 1 – RESUMEN

1.1 Título del Estudio de Caso/Proyecto Piloto: PROYECTO PILOTO PARA EL MANEJO SUBREGIONAL DE LA LANGOSTA ESPINOSA DEL CARIBE – MASPLESCA-

1.2 Agencia /Organización Implementadora: SICA-OSPESCA

1.3 Fecha de Entrega del Informe: 5-03-2013

1.4 Periodo al cual aplica el Informe Final¹ de cierre

1.5 Estado de implementación de los componentes y actividades del PP/EC (verifique la casilla adecuada).

- La ejecución de los componentes y actividades del PP/EC está avanzando según lo proyectado en el plan de trabajo/esquema de implementación.
- Existe cierto atraso en la ejecución de los componentes y actividades del PP/EC, pero no es necesario realizar una revisión del plan de trabajo/esquema de implementación.
- La ejecución de los componentes y actividades del PP/EC ha experimentado un considerable retraso. Las actividades y resultados aún pueden ser entregados en el tiempo acordado para la ejecución del PP/EC, pero esto requerirá una revisión del plan de trabajo/esquema de implementación.
- El proyecto no podrá ser concluido dentro del plazo de tiempo disponible. La redefinición de metas, objetivos y resultados es necesaria.
- Otro (por favor especifique)

¹ El informe del último periodo recoge los resultados obtenidos por el proyecto piloto .

SECCIÓN 2 – ESTADO DE LAS ACTIVIDADES / COMPONENTES DEL PROYECTO

2.1 Nivel de Progreso hacia la Finalización de los Componentes del PP/EC

CRONOGRAMA "MASPLESCA"												12/17/12	
PERIODO DE IMPLEMENTACION PILOTO (Plan ORIGINAL - TdRs, 4nov 2011):													
PERIODO DE IMPLEMENTACION PILOTO (Plan ADAPTADO - Febrero 2012):													
REPORTEO (Planificación Original - TdRs, 4 nov 2010):													
REPORTEO (Actual, o según Plan adaptado):													
DESEMBOLSOS CLME (Planificación Original - TdRs, 4 nov 2010):													
DESEMBOLSOS CLME (Actual, o según Plan adaptado):													
4.1. COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE TEMAS CLAVES DE MANEJO Y GOBERNANZA													
4.1.1 Identificación del proyecto con los actores de la cadena productiva de la langosta													
4.1.2 Metodología para el Levantamiento de la Información													
4.1.3 Intercambio Regional sobre la langosta del Caribe													
4.2. COMPONENTE: MANEJO Y GOBERNANZA REGIONAL													
4.2.1 Identificación de sitios estratégicos													
4.2.2 Selección de sitios estratégicos													
4.2.3 Apropiación por parte de los grupos locales													
4.2.4 Manejo de pesquerías con enfoque ecosistémico													
4.2.5 Apoyo institucional al seguimiento y monitoreo													
4.2.6 Asistencia horizontal													
4.3. COMPONENTE: FORMULACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO REGIONAL													
4.3.1 Elaboración del Plan de Manejo													
4.3.2 Taller Regional para la discusión del Plan de Manejo Regional (fusionado con el Foro)													
4.4. MANEJO ADAPTATIVO Y APRENDIZAJE													
5.1. Estrategia de divulgación													
5.2. Foro Regional "Hacia un modelo de gobernanza regional"													
5.3. Organización para la ejecución													

2.2 Progreso hacia los resultados esperados

RESULTADOS ESPERADOS de acuerdo al PLAN DE TRABAJO/TORs	PRINCIPALES LOGROS Y PROGRESOS OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME	INDICADORES DE DESEMPEÑO	INDICADORES DE IMPACTO
C1. Metodología para el levantamiento de Información, Identificación de actores y temas clave de manejo y gobernanza	<p>CONCLUIDO:</p> <p>1. Los principales actores clave de la pesquería de langosta del Caribe en Centroamérica fueron identificados en base a su posición en el ciclo de política de la pesquería y formaron parte de la ejecución del MASPLESCA.</p> <p>2. Identificación de Temas Clave de Manejo y Gobernanza de la Pesquería de Langosta Espinosa del Caribe, <i>Panulirus argus</i>.</p> <p>3. Se recopiló información biológica, ambiental, legal y socio-económica de la pesquería en el Caribe donde se identificaron vacíos de información y manejo</p>	<p>-Entrevistas personales sistematizadas realizadas a los actores identificados en conjunto con las administraciones pesqueras y especialistas de la región.</p> <p>-Participación activa de actores en base a su posición en el ciclo de política en talleres, intercambios y Foros relacionados al manejo local, nacional y regional de la pesquería</p>	<p>- Directorio Regional de Actores Clave de la Pesquería de la Langosta Espinosa del Caribe</p> <p>- Participación de los actores en la identificación de temas comunes de manejo de importancia local y regional validados en el Taller de Roatán, Honduras en Enero de 2011.</p> <p>-Base de Datos Regional sobre Información de la pesquería de langosta que ha</p>

			servido para conectar con el programa IMS/REMS
C2. Apropiación por parte de los grupos locales en los sitios estratégicos de Belice, Honduras y Panamá.	<p>CONCLUIDO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identificados los Sitios piloto estratégicos para trabajar localmente en los temas clave de manejo y gobernanza de langosta 2. Trabajo con Grupos Locales en la definición de la problemática que se enfrenta para el manejo del recurso así como las oportunidades de trabajar regionalmente 3. Planes locales de manejo de los 3 sitios estratégicos de Caye Caulker Belice, Roatán y Guna Yala, elaborados con los Grupos locales mediante un proceso participativo y dinámico. 	<p>Documento "Planes Locales de Manejo de los 3 sitios pilotos :Caye Caulker,Comarca Cunayala y Roatan" incluye los planes locales por sitio e incluidos en un solo documento que pretende identificar a nivel local las acciones necesarias para el manejo coordinado intersectorial que refuerce la participación local y aporta condiciones de manejo conjunto.</p>	<p>Trabajo realizado a nivel local con tres tipos de pesquerías: Caye Caulker, buceo a pulmón (uso de laso) y trampas artesanales; Guna yala, buceo a pulmón y Roatán, uso de trampas - industrial; bajo la óptica de temas comunes en toda la región como captura de juveniles, hembras grávidas, capacidad de inspección e investigación, manejo de datos: los Grupos identificaron posibles soluciones que son también aportes al Plan de Manejo Regional.</p>
C2.5. Apoyo Institucional al Seguimiento y monitoreo	<p>Concluido:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sentadas las bases y puesta en acción un esquema para el monitoreo y seguimiento regional de la pesquería de la langosta del Caribe en base a la experiencia de INPESCA, la cual ha sido adaptada en cada país de la región. 2. Ejecutadas acciones de trabajo conjunto 	<p>-Realización de Talleres binacionales (Belice-Guatemala, Honduras-Nicaragua, Costa Rica-Panamá) para la homologación de metodologías de monitoreo y seguimiento. -Elaborada y aprobada Guía de Aplicación del reglamento OSP 02-09 para el</p>	<p>Datos generados de los monitoreos regionales donde se evidencia una ligera tendencia a la mejoría de la pesquería en los últimos 3 años luego de la primera veda regional en 2009</p>

	<p>entre países y entre usuarios en cumplimiento al Reglamento OSP 02-09 para el Ordenamiento de la pesquería de la langosta del Caribe.</p> <p>3. Datos de rendimiento que evidencian una estabilidad y ligera mejoría en la pesquería</p>	<p>seguimiento y monitoreo</p> <ul style="list-style-type: none"> -Monitoreos biológicos a bordo de embarcaciones, en plantas y mercados -Inspecciones en la temporada de pesca. -Supervisión y concienciación de la veda regional simultanea. 	
C.2.6 Asistencia Horizontal	<p>Concluido Intercambios de experiencias entre pescadores de la región que han permitido ampliar y mejorar los métodos de captura a formas mas sustentables asi como el aprendizaje sobre las tendencias del mercado en la compra responsable de langosta, el uso de nasas artesanales, el uso del laso para la captura de langosta viva; medidas internacionales para la sostenibilidad de la pesca de langosta.</p>	<p>- Realización de actividades practicas conjuntas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Intercambio de pescadores artesanales de Nicaragua, Guatemala y Panamá para la construcción y uso de nasas b. Intercambio de pescadores artesanales de Belice y Panamá para el uso del laso en la captura de langosta c. Intercambio entre empresarios centroamericanos con compradores de estados unidos en la Feria Internacional de Boston 	<p>-Pescadores artesanales de Panamá han construido nasas para usar en la provincia de Bocas del Toro como alternativa de método de captura.</p> <p>-Empresarios de Honduras y Nicaragua han establecido relación de negocios con empresarios que capturan langosta viva donde se necesita capturar langostas con tallas arriba de las 5-6 pulgadas</p>
C.2.7 Promoción del Modelo de Gobernanza	<p>Acuerdo Regional a nivel de ministros entre el CRFM y OSPESCA para la puesta en marcha de un Plan de Accion para el Caribe</p>	<p>Reunión conjunta entre los países del CARICOM y SICA para la firma de un memorandum de entendimiento que define acciones conjuntas en el Caribe</p>	<p>Plan de Accion incluye acciones puntuales para el manejo a nivel del Gran Caribe para la pesqueria de la langosta espinosa.</p>

<p>C3. Formulación de Plan de Manejo Subregional de la langosta Espinosa del Caribe (<i>Panulirus argus</i>)</p>	<p>Elaborado Plan de Manejo Subregional elaborado por un equipo de expertos centroamericanos validado anivel tecnico e intersectorial</p>	<p>Documento presentado en el Foro Regional de cierre del MASPLESCA a los actores clave que han acompañado la ejecución del proyecto piloto y quienes han dado sus aportes y comentarios al mismo</p>	<p>Status del plan de manejo regional</p>
<p>C.4 Manejo Adaptativo (coordinación regional) C.4.2 Estrategia de divulgación</p>	<p>Seguimiento con las acciones de divulgación y preparación de material para la presentación de resultados finales del proyecto</p>	<p>1.- Video de buenas prácticas y de resultados del proyecto elaborados con el apoyo del gobierno de Guatemala y Ruta Verde. 2- Preparación de material fílmico y fotos que servirán de respaldo para los videos.</p>	<p>Video de buenas prácticas presentado en el Foro Regional para el manejo conjunto de la pesquería de langosta</p>
<p>Foro Regional</p>	<p>Foro Regional "Hacia una modelo de gestión regional de la langosta", donde se presentaron los resultados del MASPLESCA por parte del equipo regional responsable de la ejecución y los actores clave que han acompañado la ejecución del proyecto.</p>	<p>-Participantes de las administraciones pesqueras, organizaciones regionales y del Caribe proyectos regionales, pescadores artesanales y empresarios centroamericanos -Ayuda Memoria del Foro.</p>	<p>Plan de Manejo Regional presentado y revisado con los actores clave. Plan de Manejo Regional será presentado ante los Comités de Dirección de OSPESCA y CLME</p>



2.3 Contribuciones al Programa de Acciones Estratégicas (PAE) del CLME

Tipo de Contribución	Describa brevemente cómo el PP/EC ha contribuido al desarrollo del PAE del CLME	Capítulos correspondientes del PAE
Acciones tempranas de implementación del PAE		
Ampliación del alcance de resultados tempranos obtenidos bajo el PP/EC		
Identificación de las Direcciones Estratégicas para el PAE		
Identificación de (potenciales) Acciones Estratégicas a ser incluidas en el PAE		
Apoyo a la obtención de endoso para el PAE		
Otros ²		

² Por favor especifique. Añada secciones adicionales según sea necesario.

Sección 3 – NIVEL DE IMPLEMENTACION FINANCIERA DEL PROYECTO

3.1 Gastos reales versus gastos planificados.³

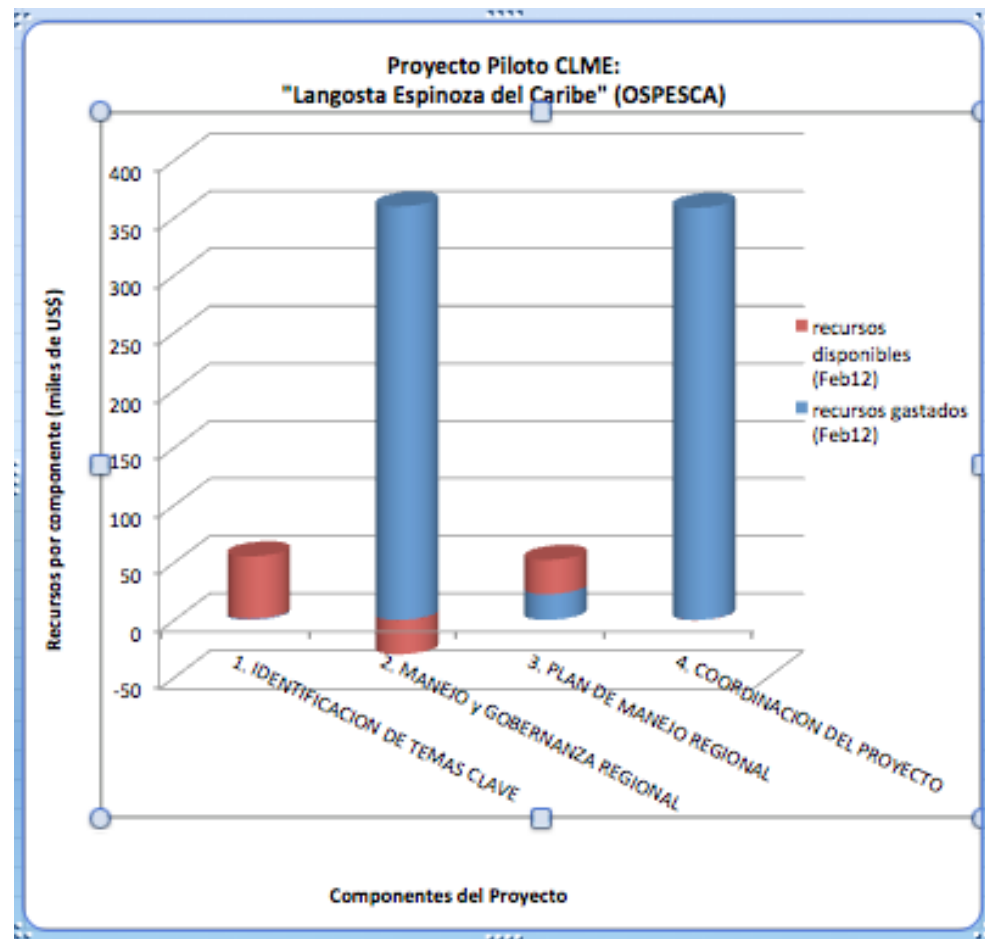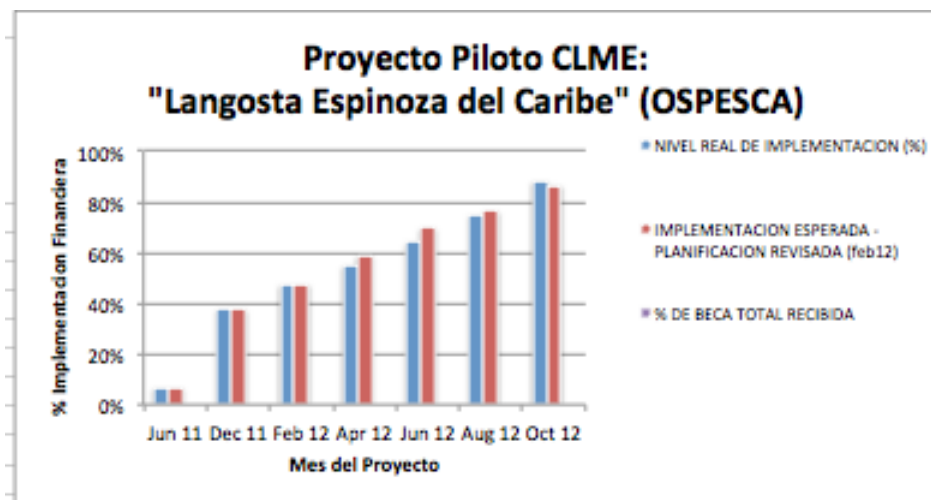

³ Coloque los gráficos generados en la hoja financiera de Excel en esta sección. Adjunte el archivo completo de Excel como anexo.

COMPONENTES & ACTIVIDADES	\$ gastos cumulativos previstos	% implementación real cumulativa	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION respecto a Planificación Revisada para cada periodo de reporte																							
			2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
4.1. COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE TEMAS CLAVES DE MANEJO Y GOBERNANZA	55,329	100%	100%												100%											
4.2. COMPONENTE: MANEJO Y GOBERNANZA REGIONAL	330,079	109%	100%												102%	81%	75%	152%	158%	140%						
4.3. COMPONENTE: FORMULACIÓN DE UN PLAN DE COORDINADOR DEL PROYECTO (MANEJO ADAPTATIVO Y	52,240	43%	N.A.												N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	69%				
	358,648	100%	100%												93%	54%	96%	245%	163%	84%						
% implementación durante cada periodo								7%					31%		10%		8%	9%	11%	13%	12%					
% acumulativo de implementación								7%					38%		47%	55%	64%	75%	88%	100%						
% de implementación acumulativa esperada (según plan revisado)								7%					38%		47%	59%	70%	76%	87%	100%						
			mes calendario ->																							
			AÑO ->																							
			2011												2012											

3.2 Planificación adaptativa de la implementación financiera (según resulte necesario).

¿La implementación financiera está ocurriendo de acuerdo a lo planeado?	Si
¿Por qué razón?	
¿Cuáles son las acciones planeadas para corregir dicha situación?	

3.3 Planificación financiera revisada 4 (NO APLICA)

Ver la sección 3.1

SECCIÓN 4 – PARTICIPACIÓN DE ACTORES Y COMUNICACIÓN

4.1 PARTICIPACIÓN DE ACTORES

Describe brevemente las principales actividades de participación de actores llevadas a cabo dentro del periodo de reporte. (Utilice viñetas para separar las actividades)

- Foro Regional celebrado en Nicaragua los días 11 y 12 de diciembre de 2012, con la participación de actores claves de la región centroamericana, Rep. Dominicana, invitados especiales del caribe, puntos focales de CLME.

4.2 COMUNICACIÓN

Stakeholders ⁵ Countries	Ministries of Fisheries	Ministries of Environment	Ministries of Foreign Affairs	Private Sector	Civil Society	Fisher-folks Org	Others ⁶	
Antigua & Barbuda								
Bahamas	X			X	X			
Barbados						X		
Belize	X			X		X		
Brazil						X		
Colombia	x							
Costa Rica	X	X				x		
Dominica								
Dominican Republic	x					x		
Grenada								
Guatemala	X	X				x		
Guyana								
Haiti								
Honduras	x	X		X	X	X		

⁴Nuevo gráfico que muestra el gasto proyectado para cada ejercicio económico bimensual.

⁵ Stakeholders involved and/or consulted during the reporting period. Please place an "X" in the relevant boxes.

⁶ Please specify

Jamaica	X							
Mexico	X							
Panama	x				X	X		
St. Kitts & Nevis								
St. Lucia								
Suriname								
Trinidad & Tobago								
Cuba	x	X						
Venezuela								
Others ⁷								
International IGOs, Regional IGOs, Others	CRFM, USAID-MAREA, USAID-Iniciativa de la langosta, CCAD, WWF, FAO, CERMES							

Principales materiales de información pública producidos con (co)financiación del CLME durante el período reportado	Público Meta	Cantidad
Video de buenas prácticas de manejo en la pesca de langosta y resumen del MASPLESCA	administraciones pesqueras, Pescadores, industriales	2 videos finales
Creación de Carpeta compartida DROPBOX donde se colocaron varios archivos de fotos alusivas a las diferentes actividades.	administraciones pesquera de Guatemala, OSPESCA, CLME	Varios archivos
Traducción al inglés del Plan Local de Manejo de Caye Caulker, Belice.	pescadores, industriales, comerciantes, restaurantes	
Edición de Planes locales de manejo de los 3 sitios pilotos.	pescadores, industriales, comerciantes, restaurantes	
Material divulgativo de buenas prácticas.	Actores claves que participaron del Foro Regional.	

- ¿ Los logos CLME/GEF fueron incorporados de manera sistemática en los materiales de divulgación producidos?

Si

no

⁷ Please specify

SECCIÓN 5 – INTEGRACIÓN & COORDINACION CON OTROS PP/ECs DEL CLME TALES COMO “MARCO DE GOBERNANZA”, “IMS-REMP”, ETC.

5.1 Actividades de Coordinación con otros PPs/ECs

Describa brevemente las actividades de coordinación más importantes llevadas a cabo con los PP/ EC “Marco de Gobernanza”, “IMS-REMP” u otros PPs/ECs del CLME (Utilice viñetas para separar las actividades)

- Trabajo con el IMS/REMS en la definición de la plataforma para langosta, Paul Geerders
- Trabajo conjunto con CERMES en el tema de Gobernanza de la Langosta espinosa del Caribe, Lucia Fanning

SECCIÓN 6 – COMENTARIOS ADICIONALES, CONCLUSIONES GENERALES, RECOMENDACIONES, LECCIONES APRENDIDAS

Comentarios Adicionales, Conclusiones Generales, Recomendaciones, Lecciones Aprendidas (Utilice viñetas para separar las actividades)

- La participación de los pescadores, empresarios, funcionarios de las administraciones, puntos focales en los ministerios de ambiente de la región así como expertos regionales ha sido clave en el cumplimiento de las metas establecidas
- La política de integración y su modelo de gobernanza regional aplicado a la langosta espinosa del Caribe avanza positivamente en la región Centroamericana y se insta a países del Caribe con esta pesquería a unirse en este esfuerzo
- El Plan de Manejo Regional de la Langosta del Caribe presentado en el Foro, recoge importantes aportes de los Panes Locales y de la experiencia de manejo centroamericano el cual ya con las observaciones técnicas entra en un proceso interno de aceptación y aprobación para la posibilidad de que sea un Plan de Manejo vinculante.

ANEXOS

- Cuadro Adaptativo Excell MASPLESCA-CLME
 - Plan de Manejo Sub-Regional de la Langosta Espinosa del Caribe, *Panulirus argus*
 - Planes de Manejo Locales de Caye Caulker, Comarca Guna Yala y Roatan para la langosta del Caribe
-

-
- Ayuda Memoria del Foro Regional “Hacia un modelo de gobernanza regional en la pesquería de la langosta del Caribe”
 - Video de Buenas practicas en la pesca de langosta espinosa
-
